


Audiência Pública sobre obras e serviços de engenharia com indícios de irregularidades graves constantes do PLOA 2019



Obras de ampliação de capacidade da BR-290/RS

Brasília, 22 de novembro de 2018.


Obras de ampliação de capacidade da BR-290/RS



Dados:

- UF: Rio Grande do Sul
- UO: Agência Nacional de Transportes Terrestres
- Funcional: Recomposição do Equilíbrio Econômico - Financeiro do Contrato de Concessão da BR-290/RS - Osório - Porto Alegre - Entroncamento BR-116/RS (Entrada P/ Guaíba) no Estado do Rio Grande do Sul
- Contrato de Concessão PG-016/97-00 (encerrado);
- Valor: R\$ 241.686.367,00 (ref. 2016)
- % execução física: 88,12%
- Benefício Estimado: R\$ 91 milhões (ref. 2016)

Obras de ampliação de capacidade da BR-290/RS

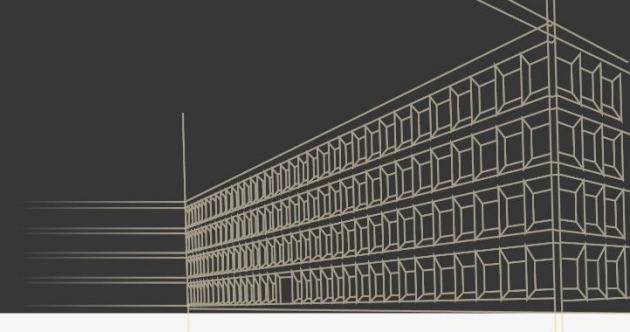

RS

26.846.2126.00P5.0043/2016 - RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DA BR-290/RS - OSÓRIO - PORTO ALEGRE - ENTRONCAMENTO BR-116/RS (ENTRADA P/ GUAÍBA) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Obra / Serviço: Obras de ampliação de capacidade da BR-290/RS

% EXECUTADO: 88,1

Termo Aditivo 13 ao Contrato PG-016/97-00

Termo Aditivo 13 ao Contrato PG-016/97-00, que inseriu conjunto de obras na BR-290/RS - Concessionária da Rodovia Osório Porto Alegre/Concepa

Valor R\$: 241.686.367,00

Data Base: 1/12/2015

- Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado e de quantitativos inadequados.
- Superfaturamento no cálculo da remuneração das obras.

Anexo VI da LOA/2018

Obras de ampliação de capacidade da BR-290/RS




Valores pagos pela ANTT

(R\$ 241,6 milhões)

Orçamento das obras

(R\$ 200,4 milhões)

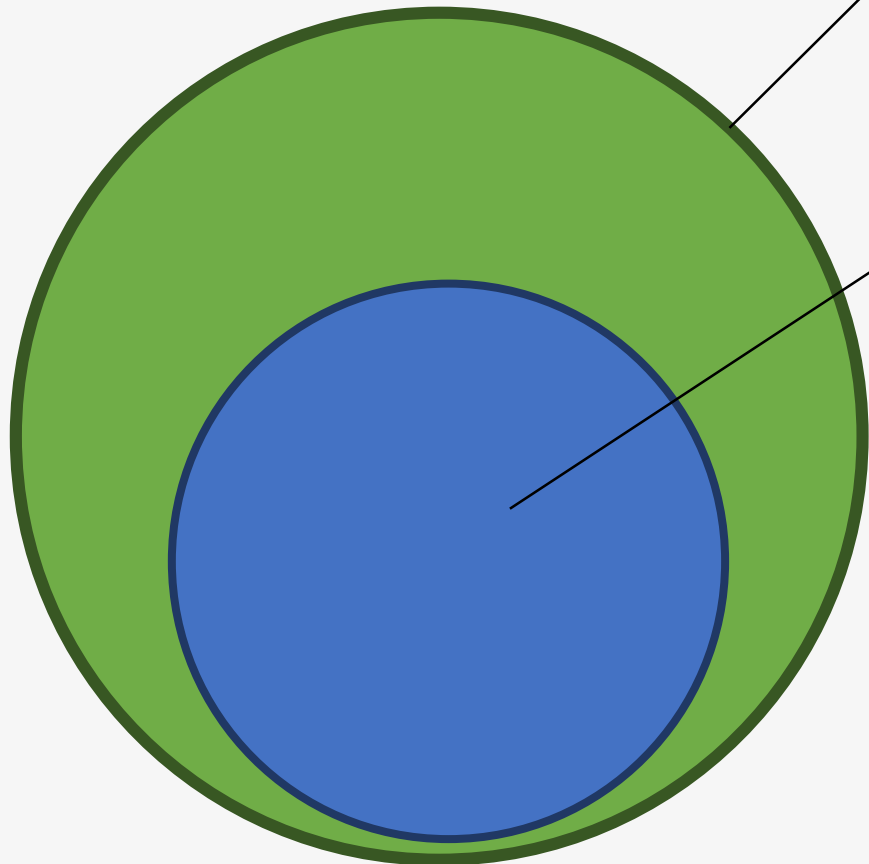


Obras de ampliação de capacidade da BR-290/RS



Orçamento das Obras

R\$ 241,6 milhões



Irregularidade 3.1

Superfaturamento no cálculo da remuneração das obras.

90%

Obras de ampliação de capacidade da BR-290/RS



R\$ 241,6 milhões

Orçamento das Obras

(R\$ 200,4 milhões)

Irregularidade 3.2

Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado e de quantitativos.

23%

Histórico Processual - TCU

2017

11/9 – Conclusão do relatório de auditoria

2/10 – Acórdão 2132/2017-TCU-Plenário (oitivas)

2018

2/10 – Instrução de Mérito (Proposta de conversão em Tomada de Contas Especial)

14/11 – Decisão monocrática do Relator (novas oitivas)




Evidências decorrentes de provas emprestadas pela Justiça Federal


Manutenção das Obras no Anexo VI da LOA/2019



Evitar o pagamento de novos valores pelas obras, conforme pleiteado pela concessionária.



Via Administrativa



Via Judicial

Obrigado!

aspar@tcu.gov.br

